


Projekt	Stand	9/2010	Finanzposition	HHST	6
Karlstr.33 - Sanierung Elly-Heuss-Knapp			2.2210.9440.000-0103	VH	


Projektleiter Fachber. 65: **Müllich**

KOSTEN	bis einschl.		1*: Gesamtkosten einschl. Jahr		2015		und ff.	
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Gesamt	
HH-Einstellung	950.000	2.000.000	1.000.000	350.000			4.300.000	
Zahlungsstand	1.671.458	1.307.718					2.979.176	
Kostenschätzung			vom 12. Aug 08			4.200.000		
Kostenberechnung			vom 11. Mrz 09			4.200.000		
Genehmigter Beschluss			vom 11. Mrz 09		5. Nov 09		4.300.000	
Abrechnung geschätzt				100%		0	●	4.300.000

€ brutto **Liquiditätsbereitstellung**

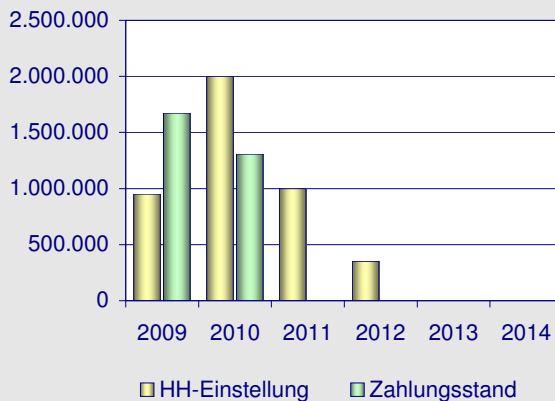

€ brutto **Budgetkontrolle**

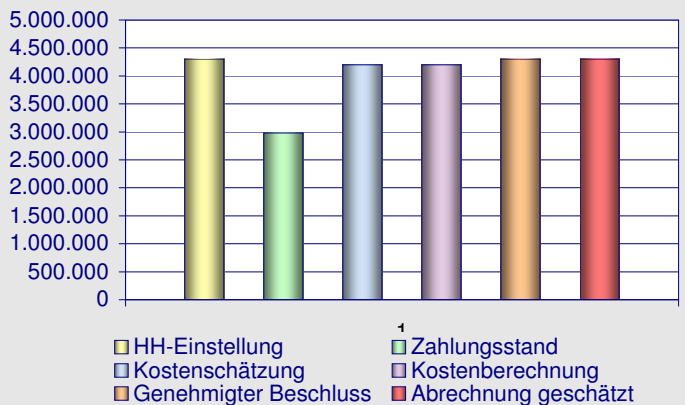

Erläuterungen

1. Bauabschnitt: (02.2009-02.2010)

Die Sanierung von 25 Klassenräumen, des Musiksaals, der Schüler-Toilettenanlagen und der Verkehrswege in der Süd- und der Ostspange des Gebäudes wurde bereits fertiggestellt.

2. Bauabschnitt: (geplant 02.2010-31.12.2011)

Sanierung der westlichen und nördlichen Gebäudespangen sowie Errichtung einer Aufzugsanlage und eines Fluchttreppenturmes (aktuell in der Planung und Ausführung)

Die Ausführung erfolgt im Schulbetrieb und während den Ferienzeiten.

Die Sanierung wird weitgehend wie geplant bis Ende 2011 abgeschlossen werden können. Auf Grund der aufwändigen Schadstoffsanierungsarbeiten wird die Sanierung von ca. 3 Unterrichtsräumen voraussichtlich noch in 2012 erfolgen müssen.

TERMINE

SOLL

STATUS

Phase	von	bis				
Grundlagenermittlung	erledigt	erledigt			erledigt	●
Planung	erledigt	erledigt			erledigt	●
Ausführung	2 / 2009	12 / 2011			im Plan	●
Meilenstein bis						
Raumprogramm		-			-	
Baugesuch		-			-	
Baubeginn		2 / 2009			erledigt	●
Fertigstellung		12 / 2011			kritisch	●


Hinweise:

Projekt	Stand	9/2010	Finanzposition	HHST	7
Schulg. 6/8 - Sanierung Uhland/Anton-Bruckner			2.2130.9410.000-0112	VH	


Projektleiter Fachber. 65: **Schneider**

KOSTEN	bis einschl.		1*: Gesamtkosten einschl. Jahr		2015		und ff.		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Gesamt		
HH-Einstellung	179.423	500.000	1.800.000	1.600.000	1.400.000	770.577	6.250.000		
Zahlungsstand	74.962	128.766					203.728		
Kostenschätzung			vom 3. Jul 09			5.880.000			
Kostenberechnung			vom 9. Feb 10			6.250.000			
Genehmigter Beschluss			vom 25. Nov 09		21. Jul 10			6.250.000	
Abrechnung geschätzt				100%		0	●		6.250.000

€ brutto **Liquiditätsbereitstellung**

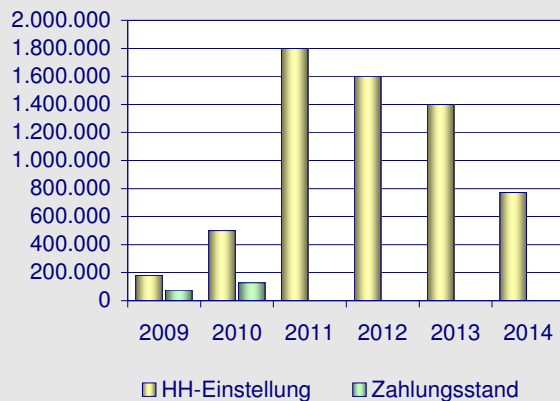

€ brutto **Budgetkontrolle**

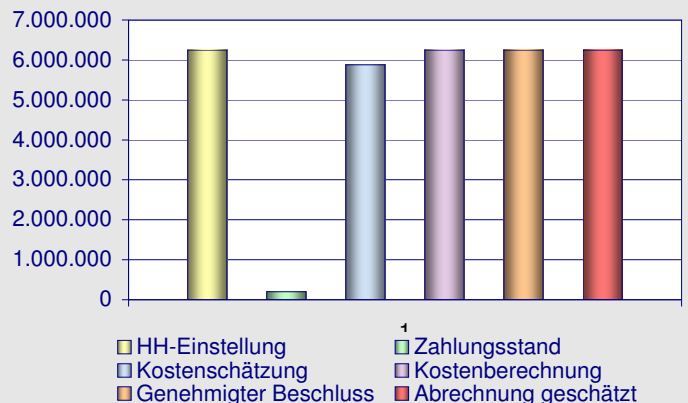

Erläuterungen

Baubeschluss 21.07.2010 (1. Ausschreibungspaket). Baubeginn: 09.08.2010

Die Beauftragung des 1. Ausschreibungspaket ist erfolgt. Die Ergebnisse der Ausschreibung liegen im Rahmen der Kostenberechnung.

Die Leistungsverzeichnisse für das 2. Ausschreibungspaket sind erstellt.

Geplante Submission 2. Ausschreibungspaket 03.11.2010.

1. BA: Sanierung Uhlandschule, Ausführungszeitraum 08/2010 bis 28/2011

2. BA. Abbruch und Neubau Verbindungsbau, Sanierung Anton-Bruckner-Schule Ausführungszeitraum 08/2011 bis

Enger Rahmenterminplan

Die Abbrucharbeiten sind weitgehend abgeschlossen.

Die Arbeiten am Dach beginnen verspätet in KW 40. Das ist jedoch unkritisch im Hinblick auf den Fertigstellungstermin.

TERMINE

SOLL

STATUS

Phase	von	bis				
Grundlagenermittlung	erledigt	erledigt			erledigt	●
Planung	erledigt	erledigt			erledigt	●
Ausführung	8 / 2010	8 / 2012			im Plan	●
Meilenstein bis						
Raumprogramm		11 / 2009			erledigt	●
Baugesuch		8 / 2009			erledigt	●
Baubeginn		8 / 2010			erledigt	●
Fertigstellung		8 / 2012			unkritisch	●

Hinweise:
