


Sachstand Digitalisierung der Kornwestheimer Schulen

Netzwerk Infrastruktur

IT-Netzwerkinfrastruktur an der Eugen-Bolz-Schule, Schillerschule, Silcherschule, Philipp-Matthäus-Hahn Gemeinschaftsschule und Ernst-Sigle-Gymnasium abgeschlossen.


Theodor-Heuss Realschule wird derzeit im Rahmen der Brandschutzsanierung umgesetzt. Bis Ende 2022 voraussichtlich 1. OG und 2. OG fertig.
Bis Mitte 2023 dann die restlichen Etagen.

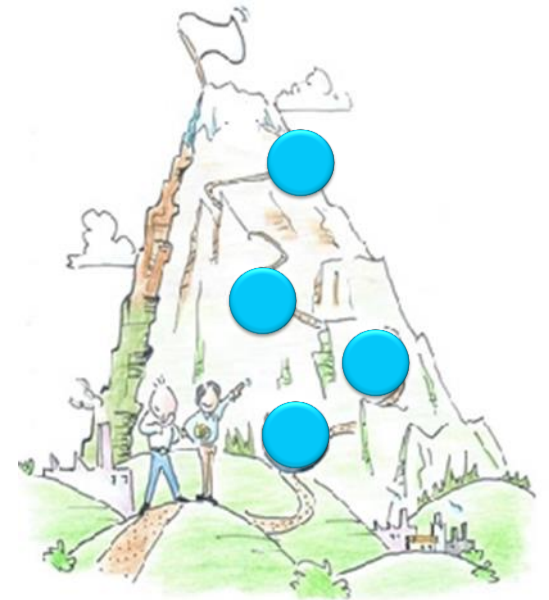

Sachstand Digitalisierung der Kornwestheimer Schulen

Sanierungspaket

- Bolzschule ist komplett abgeschlossen
Investitionssumme: 386.564,00 EUR / Fördersumme 139.000,00 EUR
Anteil Infrastrukturertüchtigung IT 213.060,75 EUR
- ESG /Schillerschule laufen die letzten Sanierungsarbeiten.
Maßnahmen werden Ende 2022 nach den Schlussabnahmen in die Abrechnung gehen
- Umsetzung- und Förderzeitraum Philipp-Matthäus-Hahn Schule wurde aufgrund der Marktlage verlängert
- THRS ist derzeit im Zeitplan und kann voraussichtlich Ende 2023 / Anfang 2024 abgerechnet werden

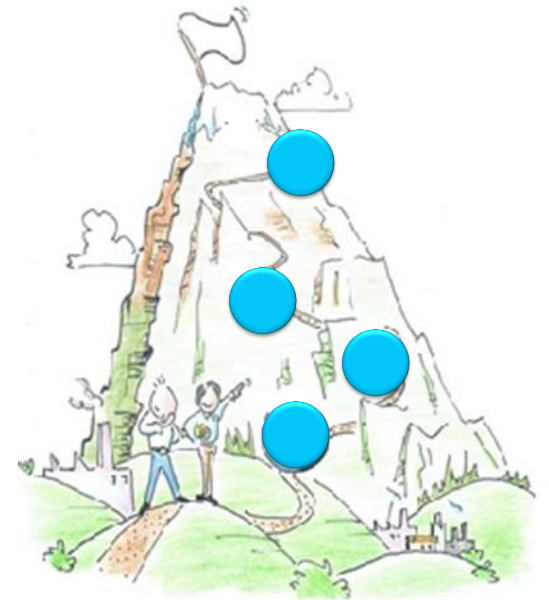


Sachstand Digitalisierung der Kornwestheimer Schulen

Digitalpakt

Umsetzung Digitalpakt im ESG und PMH abgeschlossen,
Silcherschule fast fertig.

Abgerechnet wurden Maßnahmen im Wert von 601.580,76 EUR
Davon sind Fördergelder i.H.v. 451.000,00 EUR beantragt. 53.000,00 EUR
sind bereits zugewiesen .
398.000,00 EUR befinden sich noch in der Prüfungsphase.

Schiller-/ Eugen-Bolz-Grundschule/ SBBZ /THRS befinden sich noch in der
Umsetzungsphase

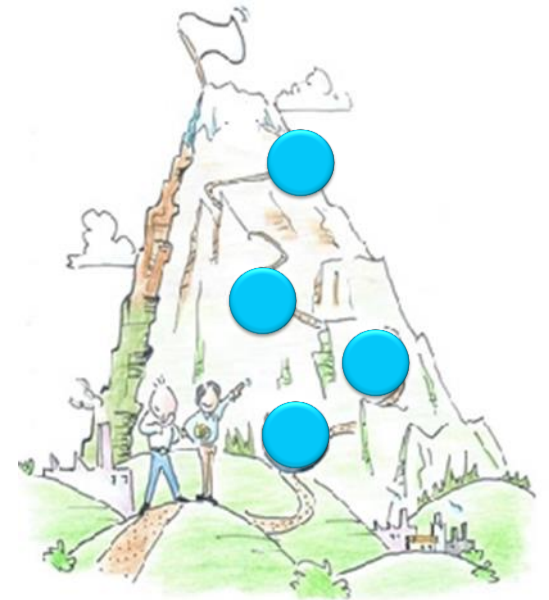

Sachstand Digitalisierung der Kornwestheimer Schulen

Ausblick 2023+2024

- Wir rechnen mit dem Abschluss der Digitalpaktmaßnahme in Kornwestheim bis Ende 2023, wenn keine weiteren Probleme wie Lieferengpässe etc. auftreten
- Start der Evaluation Medienentwicklungsplan in 2024
- Entwicklung Medienentwicklungsplan und Betriebskonzeption im Zuge der Schulentwicklung für den Campus Ost (THRS/PMH/Grundschulen)
- Umsetzung der mit dem Digitalpakt II kommenden Maßnahmen der Anforderungen

