NIXDORF CONSULT
Architekten + Ingenieure

Sanierung des Kulturhauses mit integriertem Neubau der Stadtbücherei

Rahmenterminplan Stand 04.11.2010

STADT KORNWESTHEIM

Nr.	Bezeichnung	Start	Dauer	Ende
1	Sitzungen	30.11.2010		16.12.2010
2	**Entwurfsplanung**	**10.06.2010**	**5m 2t**	**08.11.2010**
3	Bearbeitung	10.06.2010	4m 2w	15.10.2010
4	Kostenberechnung	11.10.2010	4w	08.11.2010
5	**Genehmigungsplanung**	**12.10.2010**	**4m 3t**	**14.02.2011**
6	Bearbeitung Planer	12.10.2010	1m 2w	26.11.2010
7	Einreichung	01.12.2010		01.12.2010
8	Bearbeitung Baurechtsamt	01.12.2010	2m 2w	11.02.2011
9	Genehmigung	14.02.2011		14.02.2011
10	**Ausführungsplanung**	**25.10.2010**	**10m 2w**	**05.09.2011**
11	Objektplanung	25.10.2010	10m 2w	05.09.2011
12	Gebäudetechnik	22.11.2010	8m 2w	05.08.2011
13	Statik	08.11.2010	9m	05.08.2011
14	Aussenanlagen	24.02.2011	5m 1w	05.08.2011
15	**Ausschreibung und Vergabe**	**19.01.2011**	**7m 3w**	**08.09.2011**
16	**Erstellen der Ausschreibung**	**19.01.2011**	**4m 3,2w**	**10.06.2011**
17	Paket 1 Schlüsselgewerke	19.01.2011	2m 2w	01.04.2011
18	*Paket 2*	22.02.2011	2m 2w	06.05.2011
19	*Paket 3*	25.03.2011	2m 2w	10.06.2011
20	Bieterliste und Versand	28.03.2011	1w	01.04.2011
21	Bieterbearbeitung Paket 1	04.04.2011	1m 1,4w	13.05.2011
22	Angebotsprüfung / EU-Vergaberecht Paket 1	16.05.2011	1m 1,2w	24.06.2011
23	Vergabe Paket 1	27.06.2011		27.06.2011
24	Bieterliste und Versand	02.05.2011	1w	06.05.2011
25	Bieterbearbeitung Paket 2	09.05.2011	1m 1w	17.06.2011
26	Angebotsprüfung / EU-Vergaberecht Paket 2	20.06.2011	1m 1w	27.07.2011
27	Vergabe Paket 2	01.08.2011		01.08.2011
28	Bieterliste und Versand	10.06.2011	1w	17.06.2011
29	Bieterbearbeitung Paket 2	20.06.2011	1m 1w	28.07.2011
30	Angebotsprüfung / EU-Vergaberecht Paket 2	29.07.2011	1m 1w	05.09.2011
31	Vergabe Paket 2	08.09.2011		08.09.2011
32	**Bauausführung**	**28.04.2011**	**18m 3t**	**31.10.2012**
33	Arbeitsvorbereitung + Baustelleneinrichtung	04.07.2011	1w	08.07.2011
34	Abbruch	28.04.2011	1m 4w	24.06.2011
35	**Rohbau**	11.07.2011	11m 4t	15.06.2012
36	Gebäudetechnik	13.10.2011	12m 3w	31.10.2012
37	Ausbau	02.11.2011	12m	31.10.2012
38	Aussenanlagen	02.08.2012	3m 1t	31.10.2012
39	**Bühnentechnik**	**05.04.2012**	**6m 3w**	**31.10.2012**
40	Theatersaal	05.04.2012	6m 3w	31.10.2012
41	Festsaal	28.06.2012	4m 1w	31.10.2012
42	**Projektabschluss**	**05.11.2012**	**2m 1w**	**15.01.2013**
43	Technische Abnahmen	05.11.2012	1m 4t	07.12.2012
44	Förmliche Abnahmen	26.11.2012	4w	21.12.2012
45	Mängelbehebung / Inbetriebnahme	10.12.2012	1m 3t	15.01.2013

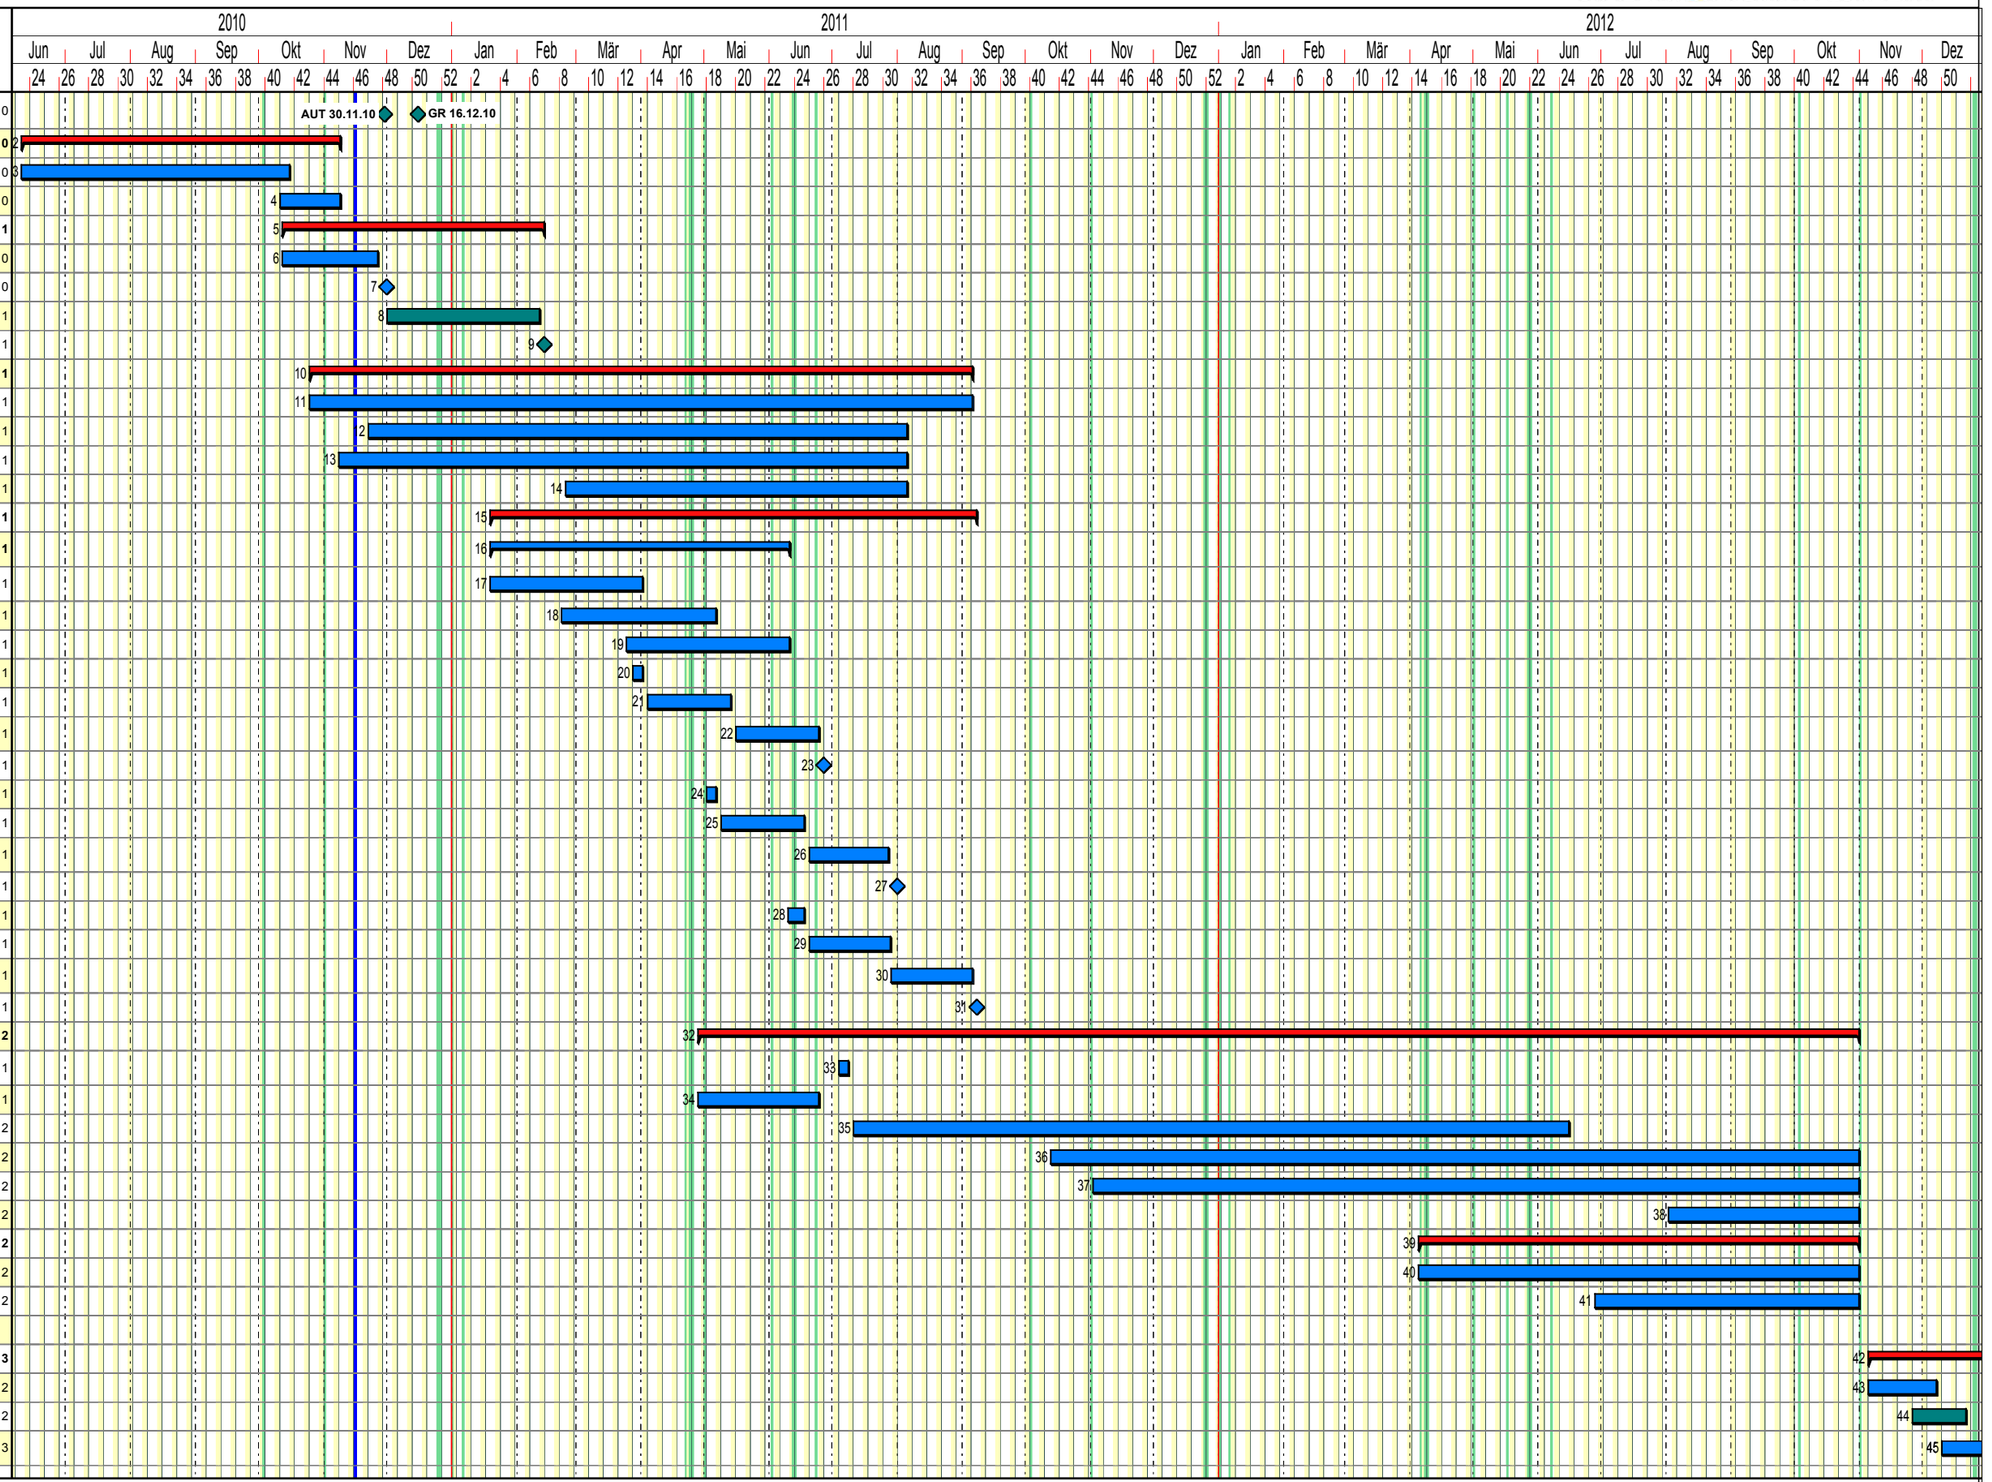

Farbcodes
Stadt | Laufzeit gesamt | Planer

Projektdatei: K:\2929 Projektsteuerung Kulturhaus Kornwestheim\5.0 Projektsteuerung\5.2 Termine\5.2.1 Terminpläne\101021_Terminplan.pp
